

仙 土 第 705号
令和 3年 7月12日

宮城県バス協会長 殿

宮城県仙台土木事務所長



道路の通行制限について（通知）

このことについて、下記のとおり制限しますので通知します。

記

1	路 線 名	(主) 仙台松島線
2	フ リ ガ ナ	ミヤギケン マツシマチ ハツハラ チナイ
	場 所	宮城郡 松島町 初原 地内
3	規 制 別	片側交互通行
4	①施工延長	①110m
	②規制距離	②220m
5	規 制 の 具体的理由	落合相川外舗装補修工事（令和3年度県舗補02321-A01号）のため
6	工 期	令和3年6月15日から 令和3年12月24日まで
7	実 際 の 規制期間	令和3年7月20日から 令和3年12月24日まで
8	規制時間	(毎日・終日) 午前9:00～午後5:00
9	土・日・祝日 の規制	規制 (する・しない)
10	道 路 標 識	A. B. C. D. E. その他（別添）
11	迂回路線名	無し
12	関 係 方 面	
13	略 図	別添のとおり
14	担 当 者	発注者：仙台土木事務所 道路建設第一班 佐藤 邦由 022-297-4125 請負者：東北ニチレキ工事株式会社 石垣 一樹 070-2035-1931



工事概要

令和3年度県舗補02321-A01号

(1) 工事名

落合相川外舗装補修工事

(2) 工事場所

(一) 竹谷大和線外 黒川郡大和町落合相川地内外

(3) 工期

自) 令和3年6月15日

至) 令和3年12月24日

(4) 請負金額

53,790,000 円 (うち消費税 ¥ 4,890,000)

(5) 発注者

宮城県仙台土木事務所長 TEL 022-297-4125

宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目1番2号 後藤 寿信

工事監督職員 総括監督員 副所長 堀米 健

主任監督員 技術次長 平間 智

監督員 技術主幹 佐藤 邦由

(6) 請負者

東北ニチレキ工事株式会社 TEL 022-285-1511

宮城県仙台市若林区沖野四丁目3-15 須藤 孝浩

(7) 現場代理人

石垣 一樹

(8) 主任技術者

生年月日

平成1年 3月 2日

1級土木施工管理技士

番号 C201000818

(9) 工事内容

施工延長 L=630m W=6.0m

路面切削工 (t=5cm) A=3,780m²

表層工 (再生密粒度As20F外、t=5cm) A=3,780m²

上層路盤工 (再生As安定処理、t=8cm) A=480m²

路上路盤再生工 (t=30cm) L=3,300m

(10) 下請けの有無

(有) ・ 無)

計画工程表

工事番号：令和3年度県道補修02321-A01号


工事名：常合相川外側築補修工事

請負者名：東北ニチレンキ工株式会社

現場代理人：石垣 一樹

主任技術者：石垣 一樹

工期：令和3年6月15日～令和3年12月24日

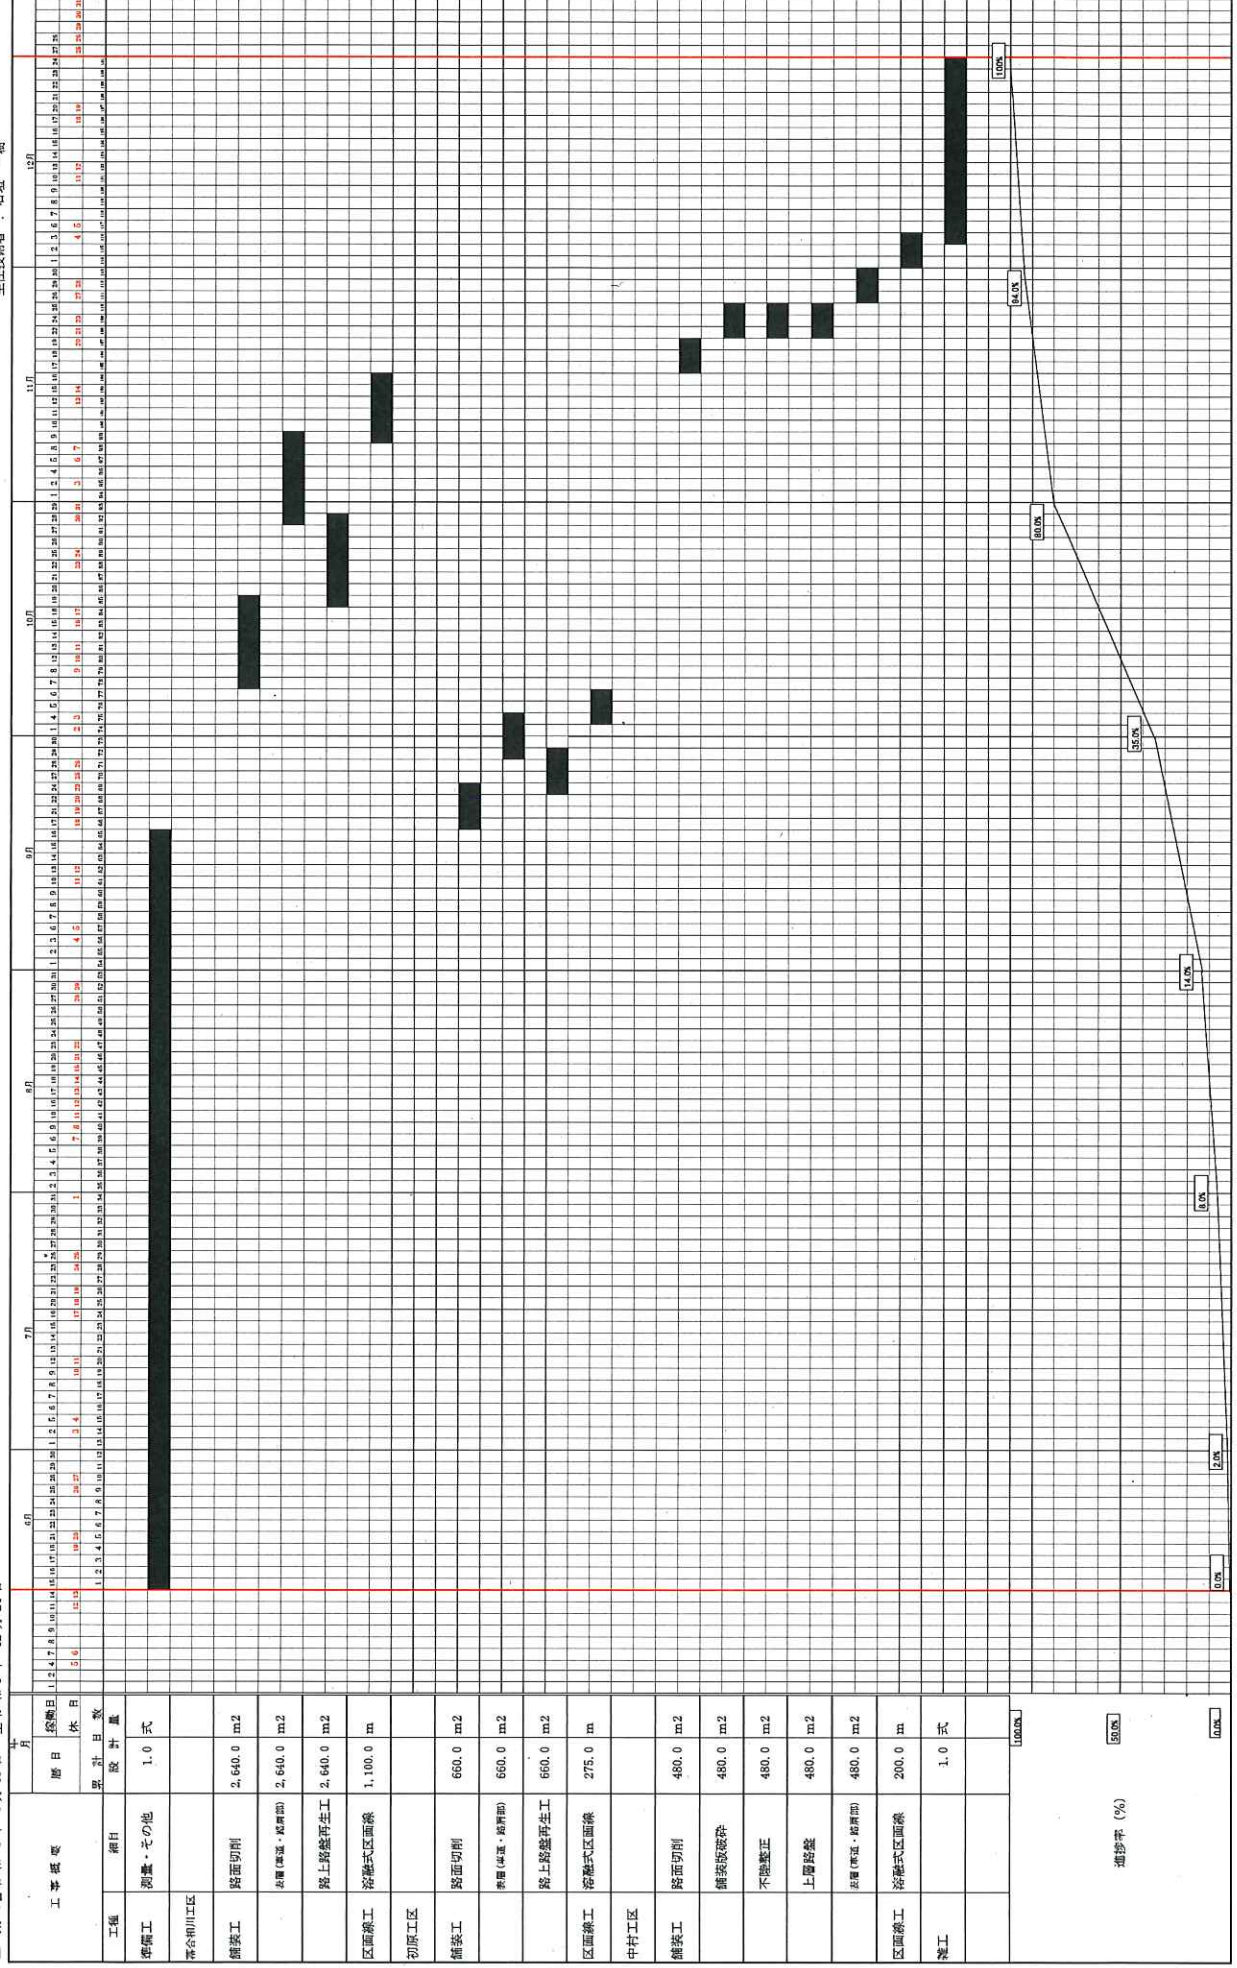



交 通 管 理

① 一般車輛及び歩行者の安全対策

- ※ 歩行者が現場場内を通行する際は、その通行を最優先とし、通行時の安全を確認した上で誘導員の指示により通行させる。
- ※ 毎日の作業打ち合わせ時に、保安施設・工事予告板等の設置方法・設置箇所及び交通規制方法等を検する。
- ※ 工事施工区間内に於いては、施工区域内に誤って第三者が進入しないよう誘導員・見張り員を配置する。
- ※ 工事区間内の路面は常に管理・補修し、段差・凹凸等により第三者の通行に支障のないようにする。

② 通勤・交通災害の防止対策

- ※ 工事に係わるすべての者は、交通法規・交通マナーを巡視する事を周知・徹底するとともに、安全・教育訓練等の場に於いても指導・啓蒙活動を行う。
- ※ 作業員の輸送車・通勤車輛の運転は専任した運転者に行わせる。
- ※ 運行に際しては、安全な通勤路を定め、通勤距離・道路事情・路面状況（降雪等）等を考慮し、時間的に余裕を持って運行するよう指導する。
- ※ 運転者は自己の健康状態を常に自己管理し、体調が思わしくない場合は申し出るとともに、現場責任者が安全な運転ができないと判断した場合は運転させない。
- ※ 運転者は運転車輛の始業前点検を実施するとともに、運転時には免許証の携帯を厳守する。
- ※ 工事車輛運転者は、前日の飲酒に於いて深酒を控えるよう指導し、遵守させる。


保安施設設置計画

保安施設について

- (1) 工事予告板は100m・200m・300mを設置します。
- (2) 工事車両出入り口には交通誘導員を配置して誘導に当たります。
工事に従事する交通誘導員は警備法施行規則第26条による教育履歴者を配置します。
- (3) 誘導員配置箇所（工事車両出入り口）には、矢印・カラーコーン等を配置し、施工区分を明確にします。
- (4) 作業時の服装は安全靴・安全チョッキを着用しヘルメット・安全チョッキには、反射シール付きの物を着用します。

- (1) 保安設置図：別 添 付

工事施工フロー 初原工区

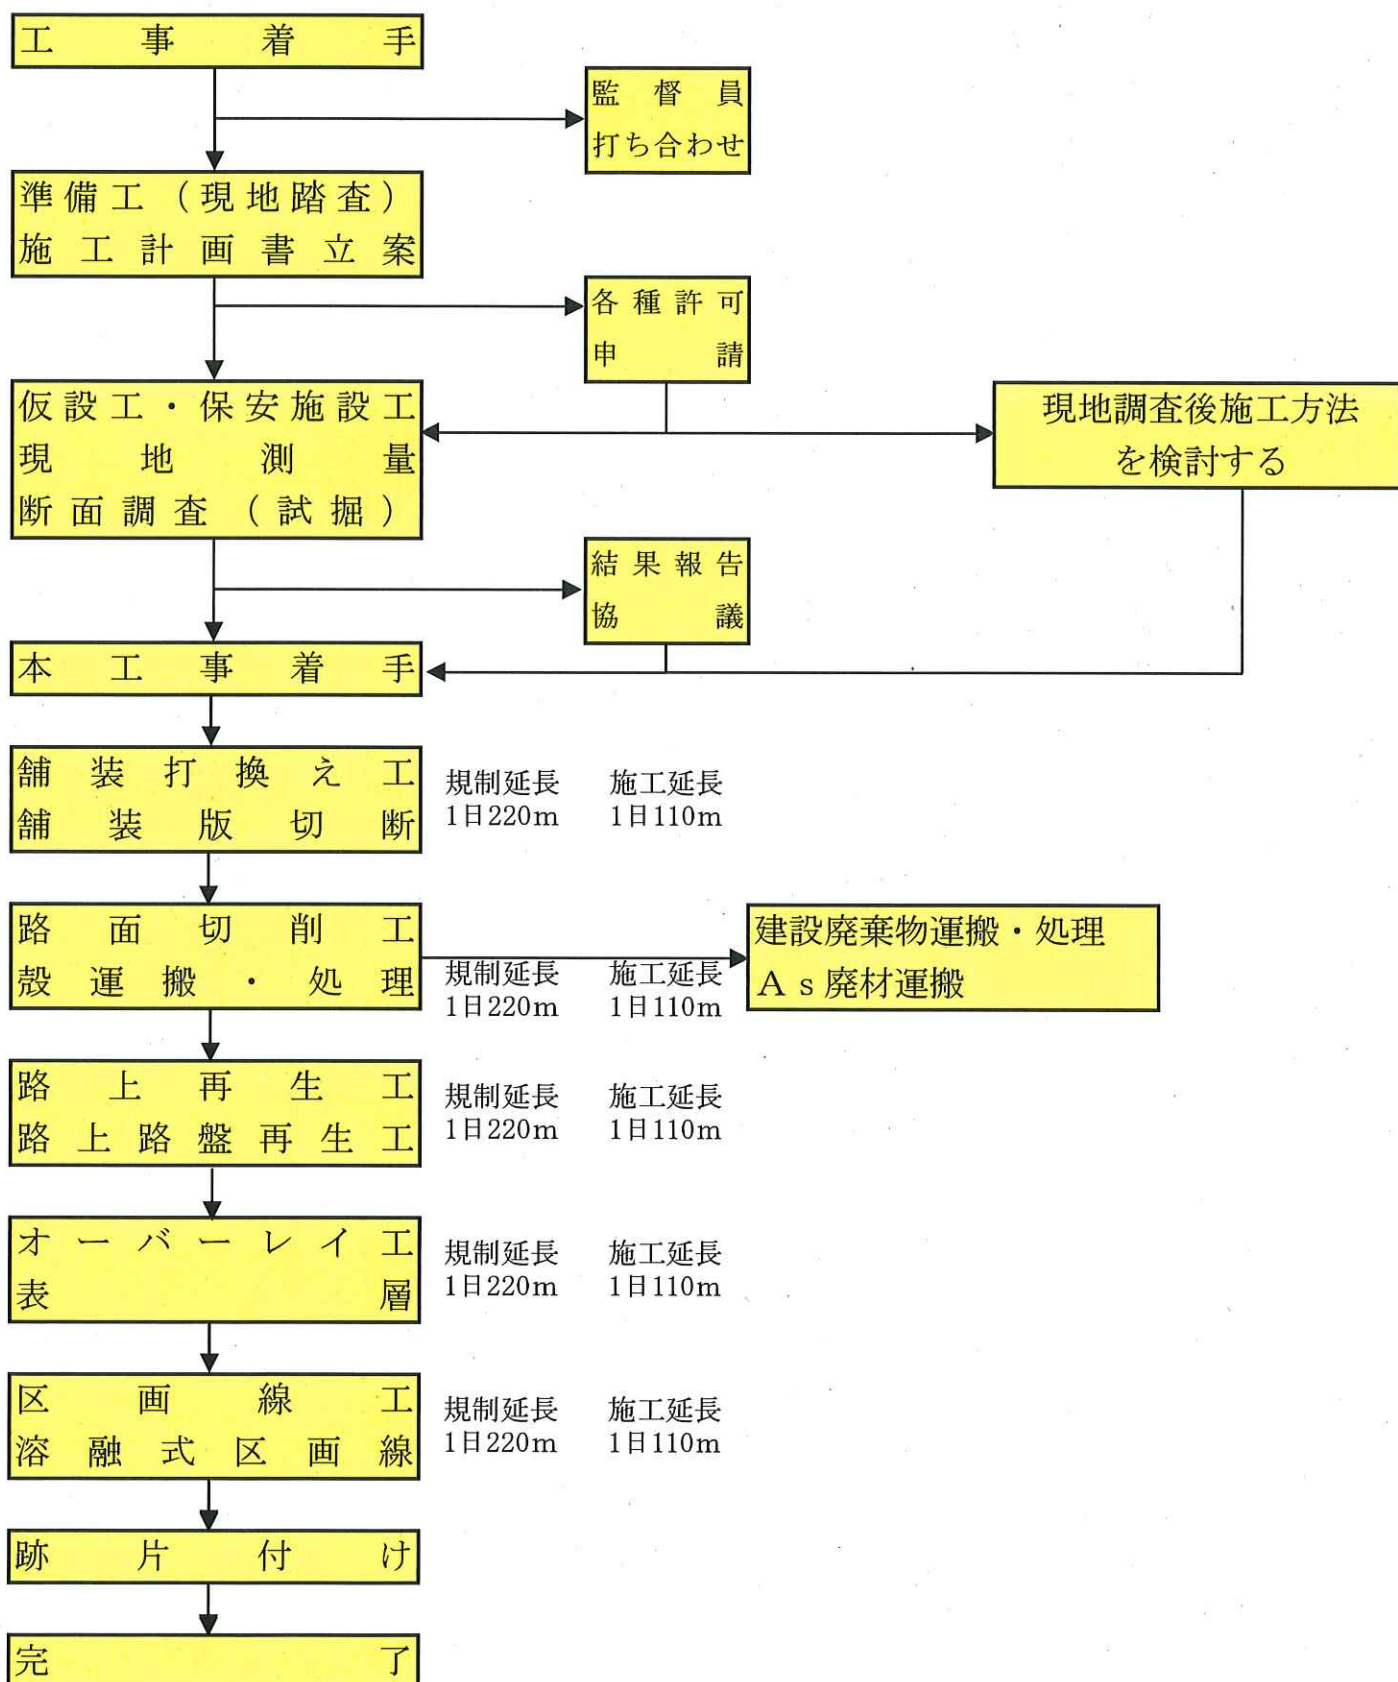

※ 各工種施工完了後次工程へ移行する。

保安施設設置計画書(工事予告・工事案内看板)

①	②	③	④	⑤	⑥
工事予告標識・・・m先	徐行標示板	お願い予告標示板	片側規制標示板	停止標示板	車両通行止標識板
 275 1400	 275 1400	 275 1400	 275 1400	 275 1400	 550 1400

⑦	⑧	⑨	⑩
迂回路標示板	指定方向誘導標識	セーフティコーン	交通誘導員
 550 1400		
